

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی عملکرد بلوک N3

(۱ الی ۶ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

## اجرای سقف

✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه

۳+ (کف ۴+) بال شرقی (زون ۳)

✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) بال

شرقی (زون ۳)

✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه

۴+ (کف ۵+) بال غربی (زون ۱) و هسته مرکزی (زون ۲)

✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف

۵+) بال غربی (زون ۱) و هسته مرکزی (زون ۲)

✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴+ (سطح ۵+)

✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۳+ (کف ۴+)

و ۴+ (کف ۵+)

✓ نصب پلیت نما در تیرهای کناری (پیرامون) سقف طبقه

۳+ (کف ۴+)

✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع



## اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های




## دیوار برشی

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۳+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۳+ بال شرقی



## پنل سقف

- ✓ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۴+(کف ۵) هسته مرکزی
- ✓ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال شرقی

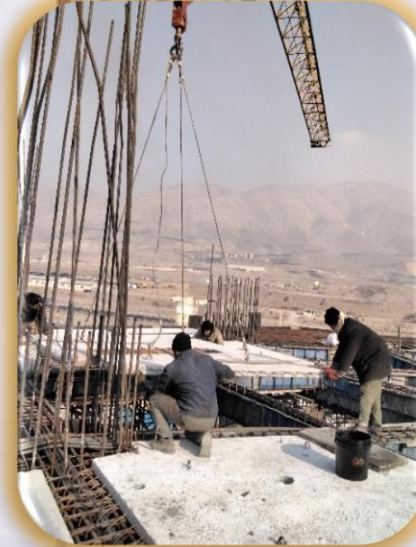

## راه پله

- ✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۱ زون بال غربی طبقه ۴ به ۵
- ✓ بتن ریزی راه پله شماره ۱ زون بال غربی طبقه ۴ به ۵



## انباری

- ✓ تکمیل وال پست های انباری طبقه ۲- و ۳-
- ✓ تکمیل دیوارچینی انباری های طبقه ۲- و ۳-
- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۴-
- ✓ اجرای یه رگه چینی انباری های طبقه ۴-



# تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۰۱



# تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۰۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۶
