

بلوک N5

گزارش عملکرد ماهانه
آبان ماه ۱۴۰۲

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com



۱۴۰۲.۸.۳۰

اجرای تیر سقف

۱۴۰۲.۷.۳۰



○ **آغاز و اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۳ + (کف ۱۴) ضلع غربی

○ **آغاز** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۳ + (کف ۱۴) ضلع غربی


○ **اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۳ + (کف ۱۴) قسمت مرکزی

○ **آغاز** آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۳ + (کف ۱۴) ضلع شرقی

شرح اجرا



شرح اجرا

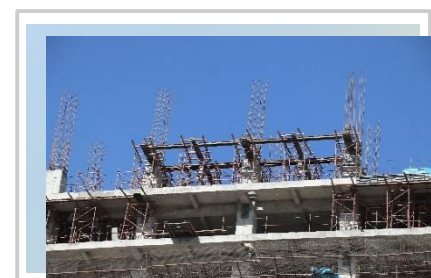

○ **آغاز** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۳ + (کف ۱۴) قسمت مرکزی



۱۴۰۲.۸.۳۰

اجرای ستون

۱۴۰۲.۷.۳۰



- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۳ + ضلع غربی

- **آغاز** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۴ + ضلع غربی

- **اتمام** قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۳ + قسمت مرکزی و ضلع شرقی

شرح اجرا



شرح اجرا

- اجرای قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۳ + ضلع غربی

- اجرای قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۳ + قسمت مرکزی





۱۴۰۲.۸.۳۰

نصب پنل

۱۴۰۲.۷.۳۰




- آغاز و اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۳ + (کف ۱۴) ضلع غربی

- آغاز نصب پنل سقف طبقه ۱۳ + (کف ۱۴) قسمت مرکزی


- اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۲ + (کف ۱۳) ضلع شرقی


شرح اجرا

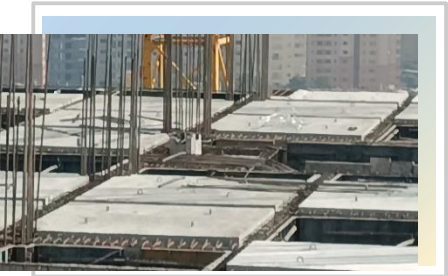

شرح اجرا

- ادامه نصب پنل سقف طبقه ۱۲ + (کف ۱۳) ضلع شرقی

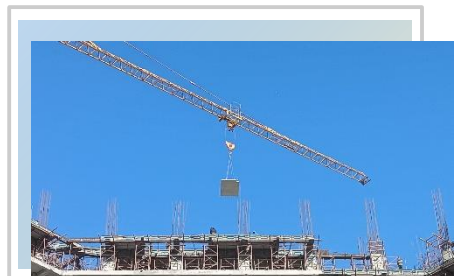

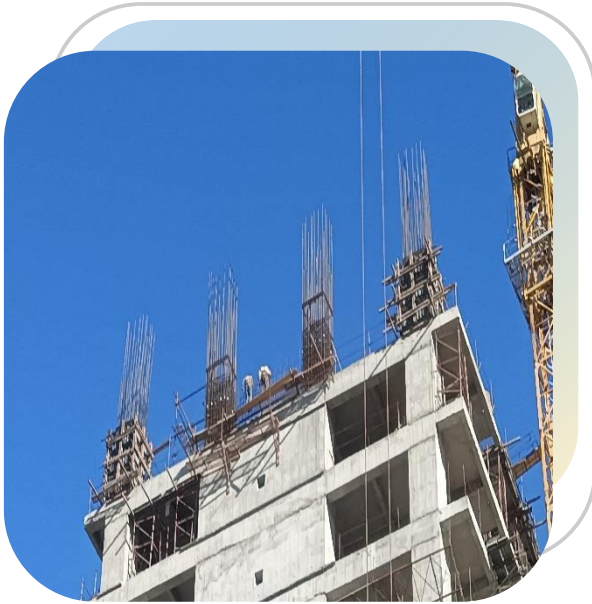

دیوار برشی



○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۳+ ضلع غربی

✎ **شرح اجرا** ○ **آغاز** آرماتوربندی دیوار برشی طبقه ۱۴+ ضلع غربی

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۴+ ضلع شرقی



راه پله

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۳+ به ۱۴+ شماره چهار

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۳+ به ۱۴+ شماره یک

✎ **شرح اجرا**



۱۴۰۲.۸.۳۰

واحد های مسکونی

۱۴۰۲.۷.۳۰



○ **آغاز** نصب وال پست قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۸+

○ **آغاز** نصب پنل پیش ساخته (ایزی وال) قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات ۷+ و ۸+

○ **آغاز** اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقات ۱+ و ۷+

○ **آغاز** اجرای یک رگه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۹+

○ **آغاز** عملیات کف سازی واحدهای مسکونی طبقه ۲+

○ **آغاز** اجرای عایق بندی ، قیرگونی و کاشی سرامیک دیوار و کف سرویس ، آشپز خانه و اتاق های واحدهای مسکونی طبقه ۲+

○ **آغاز** گچ کاری دیوار داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۲+

شرح اجرا




شرح اجرا

○ ادامه نصب پنل پیش ساخته (ایزی وال) قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات ۵+ و ۶+

○ ادامه نصب چهارچوب فرانسوی درب های واحدهای مسکونی طبقه ۲+ ضلع غربی

○ ادامه اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۶+



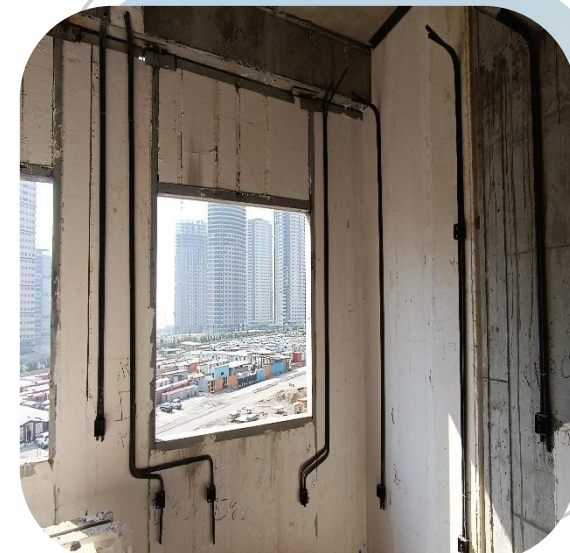

تاسیسات


○ ادامه نصب قوطی کلید و پریز و لوله برق واحد های مسکونی طبقات ۲+ و ۳+

○ ادامه اجرای تاسیسات لوله آب طبقه ۲+

○ ادامه ساخت کانال های هوا ساز جهت اجرا در واحد های مسکونی

○ **آغاز** نصب لوله دیواری برق راه پله های طبقات پارکینگ

✎ **شرح اجرا**

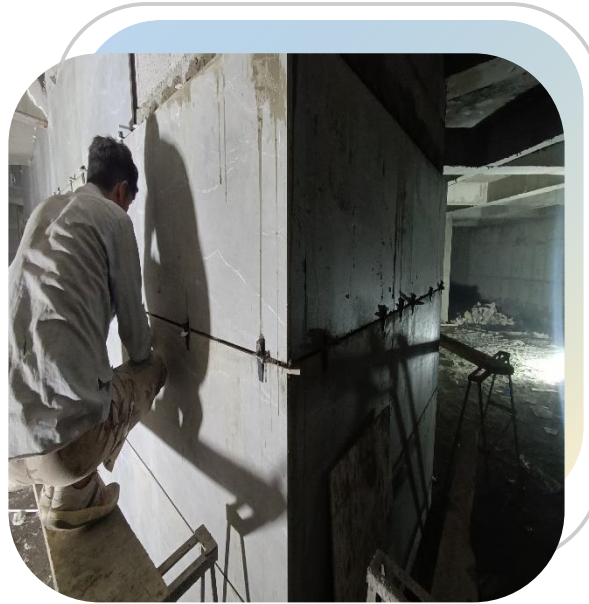

انباری ها و پارکینگ

- آغاز سفید کاری دیوارهای داخلی انباری های طبقه ۴-
- اتمام نصب موزائیک کف انباری های طبقات ۳- و ۲-
- آغاز نصب موزائیک کف انباری های طبقه ۴-
- آغاز عملیات بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۲- پارت اول الی پارت چهارم
- آغاز سرامیک کاری دیوارهای بیرونی انباری های طبقه ۵-
- ادامه پلاستر داخلی انباری های طبقه ۴-

شرح اجرا



تخلیه بار

○ ورود و تخلیه بار پنل پیش ساخته (ایزی وال) جهت نصب در قسمت پیرامونی واحد های مسکونی

○ ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحدهای مسکونی

○ ورود و تخلیه بار موزائیک جهت اجرای کف انباری های طبقات منفی

○ ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان ، ماسه ، پودر سنگ ، گچ)

✎ شرح اجرا

۱۴۰۲.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۸.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۲.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۸.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



