

بلاک N2

گزارش عملکرد ماهانه
آذر ماه
۱۴۰۳



عمران
آبشار
اسیادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar.com


مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر



اجرای سقف

اتمام آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه هفکف (کف +۱) ضلع غربی
اتمام قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه هفکف (کف +۱) ضلع غربی
آغاز بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه هفکف (کف +۱) ضلع غربی
آغاز نصب پنل سقف طبقه هفکف (کف +۱) ضلع غربی و هسته مرکزی
آغاز آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه هفکف (کف +۱) هسته مرکزی
آغاز قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه هفکف (کف +۱) هسته مرکزی



شرح اجرا 

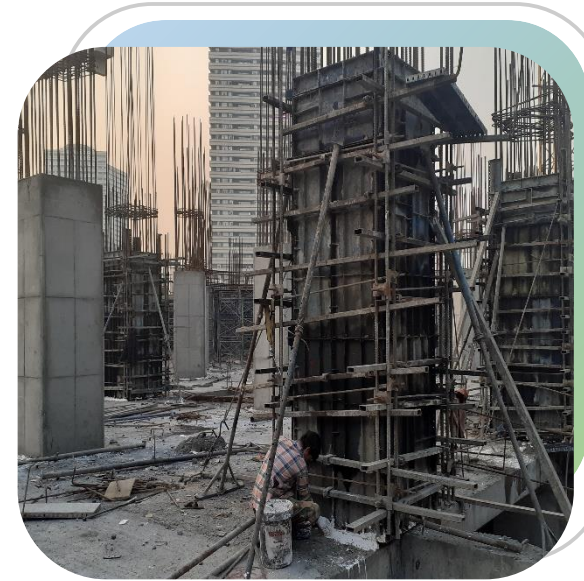

اجرای ستون

اتمام آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه همکف ضلع غربی
اتمام آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه همکف هسته مرکزی
اتمام آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه همکف ضلع شرقی
آغاز آرماتوربندی ستون های طبقه ۱+ ضلع غربی


شرح اجرا

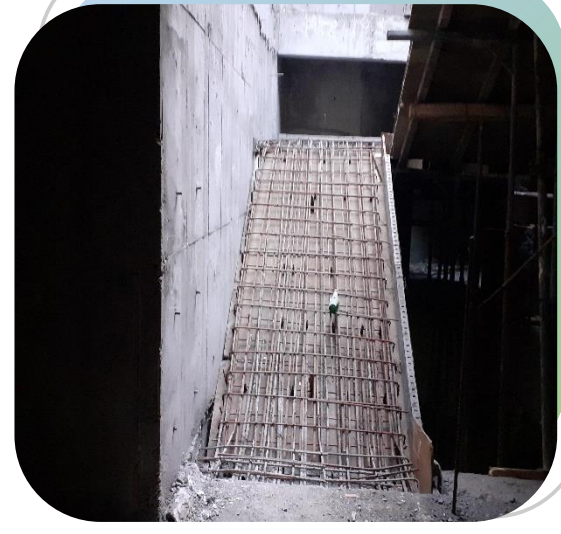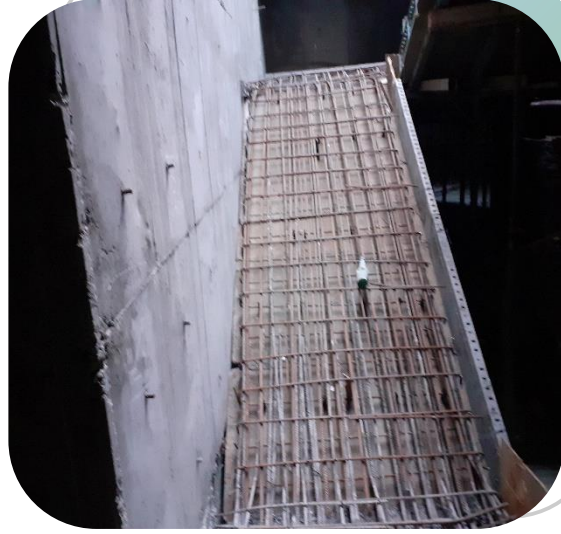

دیوار برشی و راه پله

اتمام آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه همکف ضلع غربی
آغاز آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه همکف ضلع غربی و شرقی
اجرای بتن ریزی راه پله شماره سه طبقه ۳- به ۲-
بتن ریزی راه پله شماره پنج طبقه ۱- به همکف
تسطیح خاک محوطه ضلع شمالی و جنوبی برج

شرح اجرا

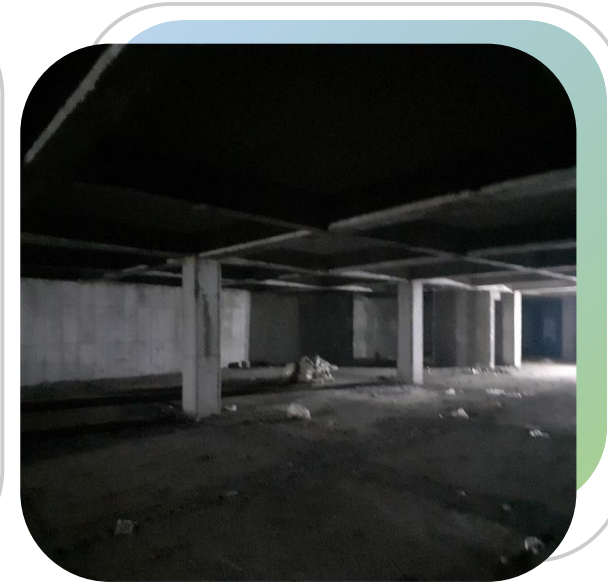

انباری و پارکینگ

- اجرای تیغه چینی دیوار انباری های پارکینگ طبقه ۴-
- اجرای سرامیک کاری دیوار انباری های پارکینگ طبقه ۵-
- اجرای سیمان کاری دیوار انباری های پارکینگ طبقه ۵-

شرح اجرا 
